

(별첨)

1. 측정 결과

측정 일시	2019년 08월 01일				
측정 결과	시료번호	측 정 지 점	측정시간 (분)	측 정 결 과 (f/cm ²)	검출석면
	0801-00	공시료	0	0.0000	허용기준미만
	0801-01	부지경계선 1	240	0.0020	허용기준미만
	0801-02	부지경계선 2	240	0.0021	허용기준미만
	0801-03	부지경계선 3	240	0.0024	허용기준미만
	0801-04	부지경계선 4	240	0.0017	허용기준미만
	0801-05	작업장주변	120	0.0044	허용기준미만
	0801-06	위생설비	40	0.0067	허용기준미만
	0801-07	음압기배출구1	40	0.0072	허용기준미만
	0801-08	음압기배출구2	40	0.0060	허용기준미만
	0801-09	폐기물반출구	40	0.0071	허용기준미만
	0801-10	폐기물보관지점	40	0.0066	허용기준미만

측정 일시	2019년 08월 02일				
측정 결과	시료번호	측 정 지 점	측정시간 (분)	측 정 결 과 (f/cm ²)	검출석면
	0802-00	공시료	0	0.0000	허용기준미만
	0802-01	부지경계선 1	240	0.0030	허용기준미만
	0802-02	부지경계선 2	240	0.0021	허용기준미만
	0802-03	부지경계선 3	240	0.0018	허용기준미만
	0802-04	부지경계선 4	240	0.0016	허용기준미만
	0802-05	작업장주변	120	0.0052	허용기준미만
	0802-06	위생설비	40	0.0071	허용기준미만
	0802-07	음압기배출구1	40	0.0081	허용기준미만
	0802-08	음압기배출구2	40	0.0066	허용기준미만
	0802-09	음압기배출구3	40	0.0067	허용기준미만
	0802-10	음압기배출구4	40	0.0073	허용기준미만
	0802-11	음압기배출구5	40	0.0065	허용기준미만
	0802-12	음압기배출구6	40	0.0083	허용기준미만
	0802-13	폐기물반출구	40	0.0059	허용기준미만
	0802-14	폐기물보관지점	40	0.0073	허용기준미만

측정 일시	2019년 08월 03일				
측정 결과	시료번호	측 정 지 점	측정시간 (분)	측 정 결 과 (f/cmf)	검출석면
	0803-00	공시료	0	0.0000	허용기준미만
	0803-01	부지경계선 1	240	0.0022	허용기준미만
	0803-02	부지경계선 2	240	0.0016	허용기준미만
	0803-03	부지경계선 3	240	0.0017	허용기준미만
	0803-04	부지경계선 4	240	0.0026	허용기준미만
	0803-05	작업장주변	120	0.0044	허용기준미만
	0803-06	위생설비	40	0.0059	허용기준미만
	0803-07	음압기배출구1	40	0.0060	허용기준미만
	0803-08	음압기배출구2	40	0.0036	허용기준미만
	0803-09	음압기배출구3	40	0.0049	허용기준미만
	0803-10	음압기배출구4	40	0.0036	허용기준미만
	0803-11	폐기물반출구	40	0.0059	허용기준미만
	0803-12	폐기물보관지점	40	0.0054	허용기준미만

측정 일시	2019년 08월 04일				
측정 결과	시료번호	측 정 지 점	측정시간 (분)	측 정 결 과 (f/cm ²)	검출석면
	0804-00	공시료	0	0.0000	허용기준미만
	0804-01	부지경계선 1	240	0.0030	허용기준미만
	0804-02	부지경계선 2	240	0.0021	허용기준미만
	0804-03	부지경계선 3	240	0.0010	허용기준미만
	0804-04	부지경계선 4	240	0.0016	허용기준미만
	0804-05	작업장주변	120	0.0036	허용기준미만
	0804-06	위생설비	40	0.0073	허용기준미만
	0804-07	음압기배출구1	40	0.0067	허용기준미만
	0804-08	음압기배출구2	40	0.0060	허용기준미만
	0804-09	음압기배출구3	40	0.0060	허용기준미만
	0804-10	음압기배출구4	40	0.0073	허용기준미만
	0804-11	음압기배출구5	40	0.0060	허용기준미만
	0804-12	음압기배출구6	40	0.0079	허용기준미만
	0804-13	폐기물반출구	40	0.0060	허용기준미만
	0804-14	폐기물보관지점	40	0.0064	허용기준미만

측정 일시	2019년 08월 05일				
측정 결과	시료번호	측 정 지 점	측정시간 (분)	측 정 결 과 (f/cm²)	검출석면
	0805-00	공시료	0	0.0000	허용기준미만
	0805-01	부지경계선 1	240	0.0020	허용기준미만
	0805-02	부지경계선 2	240	0.0032	허용기준미만
	0805-03	부지경계선 3	240	0.0022	허용기준미만
	0805-04	부지경계선 4	240	0.0024	허용기준미만
	0805-05	작업장주변	120	0.0036	허용기준미만
	0805-06	위생설비	40	0.0060	허용기준미만
	0805-07	음압기배출구1	40	0.0066	허용기준미만
	0805-08	음압기배출구2	40	0.0072	허용기준미만
	0805-09	음압기배출구3	40	0.0060	허용기준미만
	0805-10	음압기배출구4	40	0.0066	허용기준미만
	0805-11	폐기물반출구	40	0.0060	허용기준미만
	0805-12	폐기물보관지점	40	0.0073	허용기준미만

측정 일시	2019년 08월 06일				
측정 결과	시료번호	측 정 지 점	측정시간 (분)	측 정 결 과 (f/cm ²)	검출석면
	0806-00	공시료	0	0.0000	허용기준미만
	0806-01	부지경계선 1	240	0.0032	허용기준미만
	0806-02	부지경계선 2	240	0.0030	허용기준미만
	0806-03	부지경계선 3	240	0.0029	허용기준미만
	0806-04	부지경계선 4	240	0.0034	허용기준미만
	0806-05	작업장주변	120	0.0032	허용기준미만
	0806-06	위생설비	40	0.0036	허용기준미만
	0806-07	음압기배출구1	40	0.0047	허용기준미만
	0806-08	음압기배출구2	40	0.0042	허용기준미만
	0806-09	음압기배출구3	40	0.0048	허용기준미만
	0806-10	음압기배출구4	40	0.0036	허용기준미만
	0806-11	음압기배출구5	40	0.0042	허용기준미만
	0806-12	폐기물반출구	40	0.0060	허용기준미만
	0806-13	폐기물보관지점	40	0.0030	허용기준미만

측정 일시	2019년 08월 07일				
측정 결과	시료번호	측 정 지 점	측정시간 (분)	측 정 결 과 (f/cmf)	검출석면
	0807-00	공사료	0	0.0000	허용기준미만
	0807-01	부지경계선 1	240	0.0040	허용기준미만
	0807-02	부지경계선 2	240	0.0036	허용기준미만
	0807-03	부지경계선 3	240	0.0041	허용기준미만
	0807-04	부지경계선 4	240	0.0020	허용기준미만
	0807-05	작업장주변	120	0.0032	허용기준미만
	0807-06	위생설비	40	0.0085	허용기준미만
	0807-07	음압기배출구1	40	0.0078	허용기준미만
	0807-08	음압기배출구2	40	0.0059	허용기준미만
	0807-09	음압기배출구3	40	0.0083	허용기준미만
	0807-10	음압기배출구4	40	0.0060	허용기준미만
	0807-11	음압기배출구5	40	0.0060	허용기준미만
	0807-12	음압기배출구6	40	0.0078	허용기준미만
	0807-13	폐기물반출구	40	0.0061	허용기준미만
	0807-14	폐기물보관지점	40	0.0072	허용기준미만


측정 일시	2019년 08월 08일				
측정 결과	시료번호	측 정 지 점	측정시간 (분)	측 정 결 과 (f/cm²)	검출석면
	0808-00	공시료	0	0.0000	허용기준미만
	0808-01	부지경계선 1	240	0.0031	허용기준미만
	0808-02	부지경계선 2	240	0.0020	허용기준미만
	0808-03	부지경계선 3	240	0.0028	허용기준미만
	0808-04	부지경계선 4	240	0.0019	허용기준미만
	0808-05	작업장주변	120	0.0045	허용기준미만
	0808-06	위생설비	40	0.0072	허용기준미만
	0808-07	음압기배출구1	40	0.0083	허용기준미만
	0808-08	음압기배출구2	40	0.0657	허용기준미만
	0808-09	음압기배출구3	40	0.0060	허용기준미만
	0808-10	음압기배출구4	40	0.0073	허용기준미만
	0808-11	음압기배출구5	40	0.0070	허용기준미만
	0808-12	폐기물반출구	40	0.0066	허용기준미만
	0808-13	폐기물보관지점	40	0.0061	허용기준미만

[illegible]

(별첨)

2-1. 측정 지점 위치 (도식도)

부지경계

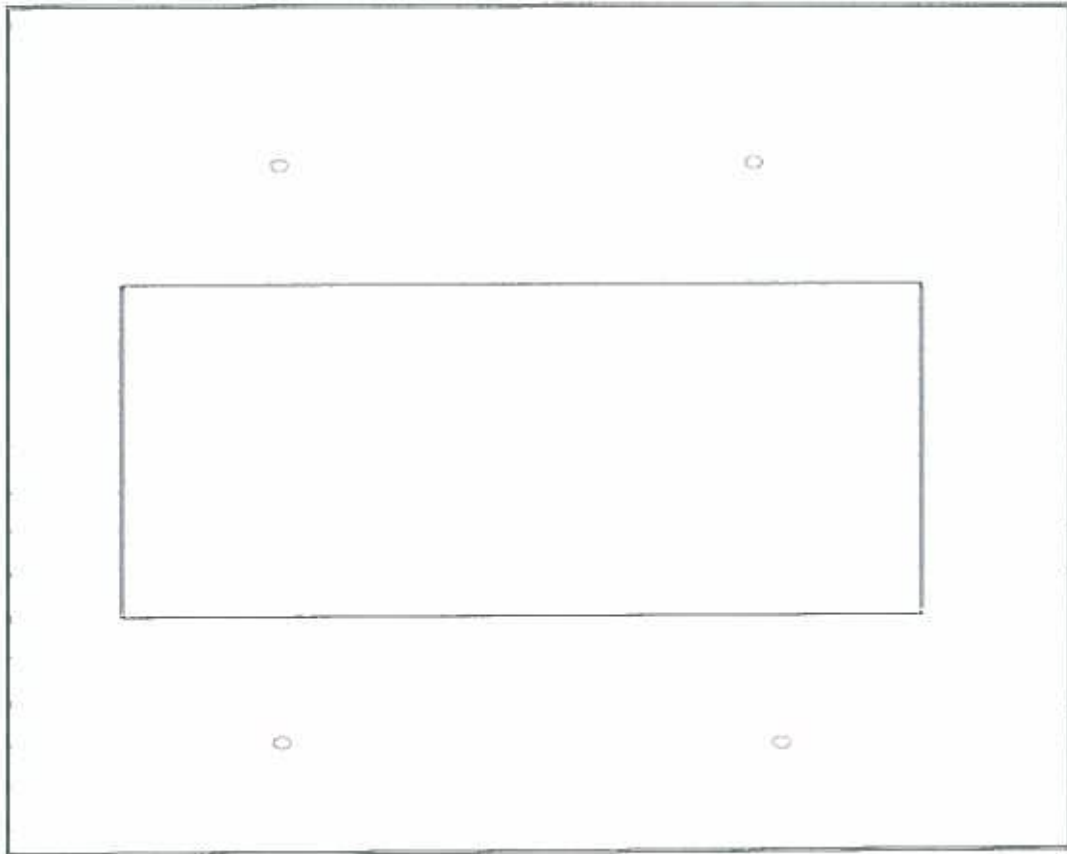

석면 비산농도 분석결과서

의뢰날짜	2019년 08월 01일	의뢰항목	해체제거 작업장 주변 석면비산농도 측정분석
현장명	영랑초 교사동 석면해체 및 제거공사		
시료수량	10개	채취일시	2019년 08월 01일
시료번호	0801-01~10	측정자	서혜정

시료번호	시료위치	유량 (L/min)	채기시간 (min)	공기중농도 (fiber/cm ³)	시료섬유수	시야수	평균섬유수/1시야 (fiber/mm ²)
0801-00	공시료	-	0	0.0000	0	100	0.00
0801-01	부지경계선 1	10.21	240	0.0020	10	100	12.73
0801-02	부지경계선 2	10.08	240	0.0021	10.5	100	13.37
0801-03	부지경계선 3	10.13	240	0.0024	12	100	15.28
0801-04	부지경계선 4	10.26	240	0.0017	8.5	100	10.82
0801-05	작업장주변	10.24	120	0.0044	11	100	14.01
0801-06	위생설비	10.09	40	0.0067	5.5	100	7.00
0801-07	음압기배출구1	10.19	40	0.0072	6	100	7.64
0801-08	음압기배출구2	10.22	40	0.0060	5	100	6.37
0801-09	폐기물반출구	10.31	40	0.0071	6	100	7.64
0801-10	폐기물보관지점	10.18	40	0.0066	5.5	100	7.00

*노출기준 : 0.01fiber/cc

*분석방법 : PCM, Phase Contrast Microscope 위상차 현미경법

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가 없이 재발행 될 수 없음.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분석일자 : 2019년 08월 01일

분석자 : 이다연



(주) 강원 환경 분석 센터



주 소 : 강원도 춘천시 후석로 595, 2층

TEL : 033 - 261 - 0049 FAX : 033 - 261 - 9049

석면 비산농도 분석결과서

의뢰날짜	2019년 08월 02일	의뢰항목	해체제거 작업장 주변 석면비산농도 측정분석
현장명	영랑초 교사동 석면해체 및 제거공사		
시료수량	14개	채취일시	2019년 08월 02일
시료번호	0802-01~14	측정자	서해정

시료번호	시료위치	유량 (L/min)	채기시간 (min)	공기중농도 (fiber/cm³)	시료섬유수	시야수	평균섬유수/1시야 (fiber/mm²)
0802-00	공시료	-	0	0.0000	0	100	0.00
0802-01	부지경계선 1	10.33	240	0.0030	15	100	19.10
0802-02	부지경계선 2	10.61	240	0.0023	11	100	14.01
0802-03	부지경계선 3	10.05	240	0.0018	9	100	11.46
0802-04	부지경계선 4	10.13	240	0.0016	8	100	10.19
0802-05	작업장주변	10.24	120	0.0052	13	100	16.55
0802-06	위생설비	10.29	40	0.0071	6	100	7.64
0802-07	음압기배출구1	10.64	40	0.0081	7	100	8.91
0802-08	음압기배출구2	10.23	40	0.0066	5.5	100	7.00
0802-09	음압기배출구3	10.13	40	0.0067	5.5	100	7.00
0802-10	음압기배출구4	10.08	40	0.0073	6	100	7.64
0802-11	음압기배출구5	10.31	40	0.0065	5.5	100	7.00
0802-12	음압기배출구6	10.29	40	0.0083	7	100	8.91
0802-13	폐기물반출구	10.34	40	0.0059	5	100	6.37
0802-14	폐기물보관지점	10.08	40	0.0073	6	100	7.64

*노출기준 : 0.01fiber/cc

*분석방법 : PCM, Phase Contrast Microscope 위상차 현미경법

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가 없이 재발행 될 수 없음.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분석일자 : 2019년 08월 02일

분석자 : 이다연



(주) 강원 환경 분석 센터



주 소 : 강원도 춘천시 후석로 595, 2층

TEL : 033 - 261 - 0049 FAX : 033 - 261 - 9049

석면 비산농도 분석결과서

의뢰날짜	2019년 08월 03일	의뢰항목	해체제거 작업장 주변 석면비산농도 측정분석
현장명	영랑초 교사동 석면해체 및 제거공사		
시료수량	12개	채취일시	2019년 08월 03일
시료번호	0803-01~12	측정자	서혜정

시료번호	시료위치	유량 (L/min)	채기시간 (min)	공기중농도 (fiber/cm ³)	시료섬유수	시야수	평균섬유수/1시야 (fiber/mm ²)
0803-00	공시료	-	0	0.0000	0	100	0.00
0803-01	부지경계선 1	10.42	240	0.0022	11	100	14.01
0803-02	부지경계선 2	10.38	240	0.0016	8	100	10.19
0803-03	부지경계선 3	10.53	240	0.0017	9	100	11.46
0803-04	부지경계선 4	10.25	240	0.0026	13	100	16.55
0803-05	작업장주변	10.27	120	0.0044	11	100	14.01
0803-06	위생설비	10.31	40	0.0059	5	100	6.37
0803-07	음압기배출구1	10.18	40	0.0060	5	100	6.37
0803-08	음압기배출구2	10.24	40	0.0036	3	100	3.82
0803-09	음압기배출구3	10.09	40	0.0049	4	100	5.09
0803-10	음압기배출구4	10.34	40	0.0036	3	100	3.82
0803-11	폐기물반출구	10.30	40	0.0059	5	100	6.37
0803-12	폐기물보관지점	10.23	40	0.0054	4.5	100	5.73

*노출기준 : 0.01fiber/cc

*분석방법 : PCM, Phase Contrast Microscope 위상차 현미경법

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가 없이 재발행 될 수 없음.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분석일자 : 2019년 08월 03일

분석자 : 이다연



(주) 강원 환경 분석 센터



주 소 : 강원도 춘천시 후석로 595, 2층

TEL : 033 - 261 - 0049 FAX : 033 - 261 - 9049

석면 비산농도 분석결과서

의뢰날짜	2019년 08월 04일		의뢰항목	해체제거 작업장 주변 석면비산농도 측정분석			
현장명	영랑초 교사동 석면해체 및 제거공사						
시료수량	14개		채취일시	2019년 08월 04일			
시료번호	0804-01~14		측정자	서혜정			
시료번호	시료위치	유량 (L/min)	채기시간 (min)	공기중농도 (fiber/cm³)	시료섬유수	시야수	평균섬유수/1시야 (fiber/mm²)
0804-00	공시료	-	0	0.0000	0	100	0.00
0804-01	부지경계선 1	10.13	240	0.0030	15	100	19.10
0804-02	부지경계선 2	10.28	240	0.0021	10.5	100	13.37
0804-03	부지경계선 3	10.06	240	0.0010	5	100	6.37
0804-04	부지경계선 4	10.34	240	0.0016	8	100	10.19
0804-05	작업장주변	10.27	120	0.0036	9	100	11.46
0804-06	위생설비	10.12	40	0.0073	6	100	7.64
0804-07	음압기배출구1	10.08	40	0.0067	5.5	100	7.00
0804-08	음압기배출구2	10.16	40	0.0060	5	100	6.37
0804-09	음압기배출구3	10.23	40	0.0060	5	100	6.37
0804-10	음압기배출구4	10.06	40	0.0073	6	100	7.64
0804-11	음압기배출구5	10.13	40	0.0060	5	100	6.37
0804-12	음압기배출구6	10.81	40	0.0079	7	100	8.91
0804-13	폐기물반출구	10.23	40	0.0060	5	100	6.37
0804-14	폐기물보관지점	10.50	40	0.0064	5.5	100	7.00

*노출기준 : 0.01fiber/cc

*분석방법 : PCM, Phase Contrast Microscope 위상차 현미경법

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가 없이 재발행 될 수 없음.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분석일자 : 2019년 08월 04일

분석자 : 이다연



(주) 강원 환경 분석 센터



주 소 : 강원도 춘천시 후석로 595, 2층

TEL : 033 - 261 - 0049 FAX : 033 - 261 - 9049

석면 비산농도 분석결과서

의뢰날짜	2019년 08월 05일	의뢰항목	해체제거 작업장 주변 석면비산농도 측정분석
현장명	영랑초 교사동 석면해체 및 제거공사		
시료수량	12개	채취일시	2019년 08월 05일
시료번호	0805-01~12	측정자	서해정

시료번호	시료위치	유량 (L/min)	채기시간 (min)	공기중농도 (fiber/cm ³)	시료섬유수	시야수	평균섬유수/1시야 (fiber/mm ²)
0805-00	공시료	-	0	0.0000	0	100	0.00
0805-01	부지경계선 1	10.31	240	0.0020	10	100	12.73
0805-02	부지경계선 2	10.22	240	0.0032	16	100	20.37
0805-03	부지경계선 3	10.05	240	0.0022	11	100	14.01
0805-04	부지경계선 4	10.36	240	0.0024	12	100	15.28
0805-05	작업장주변	10.25	120	0.0036	9	100	11.46
0805-06	위생설비	10.29	40	0.0060	5	100	6.37
0805-07	음압기배출구1	10.21	40	0.0066	5.5	100	7.00
0805-08	음압기배출구2	10.16	40	0.0072	6	100	7.64
0805-09	음압기배출구3	10.15	40	0.0060	5	100	6.37
0805-10	음압기배출구4	10.26	40	0.0066	5.5	100	7.00
0805-11	폐기물반출구	10.22	40	0.0060	5	100	6.37
0805-12	폐기물보관지점	10.14	40	0.0073	6	100	7.64

*노출기준 : 0.01fiber/cc

*분석방법 : PCM, Phase Contrast Microscope 위상차 현미경법

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가 없이 재발행 될 수 없음.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분석일자 : 2019년 08월 05일

분석자 : 이다연



(주) 강원 환경 분석 센터



주 소 : 강원도 춘천시 후석로 595, 2층

TEL : 033 - 261 - 0049 FAX : 033 - 261 - 9049

석면 비산농도 분석결과서

의뢰날짜	2019년 08월 06일	의뢰항목	해체제거 작업장 주변 석면비산농도 측정분석
현장명	영랑초 교사등 석면해체 및 제거공사		
시료수량	13개	채취일시	2019년 08월 06일
시료번호	0806-01~13	측정자	서해정

시료번호	시료위치	유량 (L/min)	채기시간 (min)	공기중농도 (fiber/cm ³)	시료섬유수	시야수	평균섬유수/1시야 (fiber/mm ²)
0806-00	공시료	-	0	0.0000	0	100	0.00
0806-01	부지경계선 1	10.32	240	0.0032	16	100	20.37
0806-02	부지경계선 2	10.27	240	0.0030	15	100	19.10
0806-03	부지경계선 3	10.29	240	0.0029	14.5	100	18.46
0806-04	부지경계선 4	10.30	240	0.0034	17	100	21.65
0806-05	작업장주변	10.15	120	0.0032	8	100	10.19
0806-06	위생설비	10.26	40	0.0036	3	100	3.82
0806-07	음압기배출구1	10.34	40	0.0047	4	100	5.09
0806-08	음압기배출구2	10.12	40	0.0042	3.5	100	4.46
0806-09	음압기배출구3	10.25	40	0.0046	4	100	5.09
0806-10	음압기배출구4	10.33	40	0.0036	3	100	3.82
0806-11	음압기배출구5	10.26	40	0.0042	3.5	100	4.46
0806-12	폐기물반출구	10.21	40	0.0060	5	100	6.37
0806-13	폐기물보관지점	10.16	40	0.0030	2.5	100	3.18

*노출기준 : 0.01fiber/cc

*분석방법 : PCM, Phase Contrast Microscope 위상차 현미경법

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가 없이 재발행 될 수 없음.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분 석 일 자 : 2019년 08월 06일

분 석 자 : 이 다 연



(주) 강원 환경 분석 센터



주 소 : 강원도 춘천시 후석로 595, 2층

TEL : 033 - 261 - 0049 FAX : 033 - 261 - 9049

석면 비산농도 분석결과서

의뢰날짜	2019년 08월 07일	의뢰항목	해체제거 작업장 주변 석면비산농도 측정분석
현장명	영랑초 교사동 석면해체 및 제거공사		
시료수량	14개	채취일시	2019년 08월 07일
시료번호	0807-01~14	측정자	서혜정

시료번호	시료위치	유량 (L/min)	채취시간 (min)	공기중농도 (fiber/cm³)	시료섬유수	시야수	평균섬유수/1시야 (fiber/mm²)
0807-00	공시료	-	0	0.0000	0	100	0.00
0807-01	부지경계선 1	10.28	240	0.0040	20	100	25.47
0807-02	부지경계선 2	10.16	240	0.0036	18	100	22.92
0807-03	부지경계선 3	10.09	240	0.0041	20.5	100	26.10
0807-04	부지경계선 4	10.23	240	0.0020	10	100	12.73
0807-05	작업장주변	10.31	120	0.0032	8	100	10.19
0807-06	위생설비	10.08	40	0.0085	7	100	8.91
0807-07	음압기배출구1	10.19	40	0.0076	6.5	100	8.28
0807-08	음압기배출구2	10.43	40	0.0059	5	100	6.37
0807-09	음압기배출구3	10.28	40	0.0083	7	100	8.91
0807-10	음압기배출구4	10.18	40	0.0060	5	100	6.37
0807-11	음압기배출구5	10.16	40	0.0060	5	100	6.37
0807-12	음압기배출구6	10.24	40	0.0078	6.5	100	8.28
0807-13	폐기물반출구	10.08	40	0.0061	5	100	6.37
0807-14	폐기물보관지점	10.26	40	0.0072	6	100	7.64

*노출기준 : 0.01fiber/cc

*분석방법 : PCM, Phase Contrast Microscope 위상차 현미경법

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가 없이 재발행 될 수 없음.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분석일자 : 2019년 08월 07일

분석자 : 이다연



(주) 강원 환경 분석 센터



주 소 : 강원도 춘천시 후석로 595, 2층

TEL : 033 - 261 - 0049 FAX : 033 - 261 - 9049

석면 비산농도 분석결과서

의뢰날짜	2019년 08월 08일		의뢰항목	해체제거 작업장 주변 석면비산농도 측정분석			
현장명	영랑초 교사등 석면해체 및 제거공사						
시료수량	13개		채취일시	2019년 08월 08일			
시료번호	0808-01~13		측정자	서 해 정			
시료번호	시료위치	유량 (L/min)	채기시간 (min)	공기중농도 (fiber/cm ³)	시료섬유수	시야수	평균섬유수/1시야 (fiber/mm ²)
0808-00	공시료	-	0	0.0000	0	100	0.00
0808-01	부지경계선 1	10.02	240	0.0031	15	100	19.10
0808-02	부지경계선 2	10.09	240	0.0020	10	100	12.73
0808-03	부지경계선 3	10.12	240	0.0028	14	100	17.83
0808-04	부지경계선 4	10.16	240	0.0019	9.5	100	12.10
0808-05	작업장주변	10.03	120	0.0045	11	100	14.01
0808-06	위생설비	10.24	40	0.0072	6	100	7.64
0808-07	음압기배출구1	10.33	40	0.0083	7	100	8.91
0808-08	음압기배출구2	10.26	40	0.0657	55	100	70.03
0808-09	음압기배출구3	10.19	40	0.0060	5	100	6.37
0808-10	음압기배출구4	10.02	40	0.0073	6	100	7.64
0808-11	음압기배출구5	10.49	40	0.0070	6	100	7.64
0808-12	폐기물반출구	10.21	40	0.0066	5.5	100	7.00
0808-13	폐기물보관지점	10.08	40	0.0061	5	100	6.37

*노출기준 : 0.01fiber/cc

*분석방법 : PCM, Phase Contrast Microscope 위상차 현미경법

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가 없이 재발행 될 수 없음.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분석일자 : 2019년 08월 08일

분석자 : 이다연



(주) 강원 환경 분석 센터



주 소 : 강원도 춘천시 후석로 595, 2층

TEL : 033 - 261 - 0049 FAX : 033 - 261 - 9049

석면 비산농도 분석결과서

의뢰날짜	2019년 08월 09일	의뢰항목	해체제거 작업장 주변 석면비산농도 측정분석
현장명	영랑초 교사동 석면해체 및 제거공사		
시료수량	6개	채취일시	2019년 08월 09일
시료번호	0809-01~06	측정자	서해정

시료번호	시료위치	유량 (L/min)	채기시간 (min)	공기중농도 (fiber/cm³)	시료섬유수	시야수	평균섬유수/1시야 (fiber/mm²)
0809-00	공시료	-	0	0.0000	0	100	0.00
0809-01	부지경계선 1	10.13	240	0.0031	15.5	100	19.74
0809-02	부지경계선 2	10.25	240	0.0020	10	100	12.73
0809-03	부지경계선 3	10.11	240	0.0026	13	100	16.55
0809-04	부지경계선 4	10.19	240	0.0016	8	100	10.19
0809-05	폐기물보관지점1	10.08	40	0.0073	6	100	7.64
0809-06	폐기물보관지점2	10.13	40	0.0060	5	100	6.37

*노출기준 : 0.01fiber/cc

*분석방법 : PCM, Phase Contrast Microscope 위상차 현미경법

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가 없이 재발행 될 수 없음.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분석일자 : 2019년 08월 09일

분석자 : 이다연



(주) 강원 환경 분석 센터



주 소 : 강원도 춘천시 후석로 595, 2층

TEL : 033 - 261 - 0049 FAX : 033 - 261 - 9049
